


PIVA ANTWERPEN

Benaming project	PIVA theorievleugel en turnzaal
Opdrachtgever	Provincie Antwerpen
Referentie opdrachtgever	PROJ-2020-009 // BenV-OPDR-2021-050
Architect	Provincie Antwerpen – departement logistiek
Stabiliteit	Forté bvba
Technieken	Atelier T
Veiligheidscoördinator	FI Safety Consult
Plaats van uitvoering	Desguinlei 244 - 2018 Antwerpen
Type opdracht	Overheidsopdracht – openbare procedure
Uitgevoerde taken/rol in het project	Hoofdaannemer
Omschrijving project/programma	<p>renovatie van de theorievleugel en turnzaal bij het provinciaal instituut PIVA te Antwerpen</p> <p>Het renovatieproject van de theorievleugel situeert zich in hoofdzaak op de 4 verdiepingen waar naast de nodige bouwkundige werken de technische installaties, met in hoofdzaak ventilatie en elektriciteit, volledig gemoderniseerd worden. De bouwkundige werken bevatten de asbestverwijdering (vloeren, mastiek binnen ramen en isolatiemateriaal), afbraak binnenwanden en – afwerking en herstellingen aan pleisterwerk, plaatsen van nieuwe systeemwanden, akoestische panelen, nieuwe vloerbekleding, nieuwe binnen ramen, vast meubilair en uitvoeren van binnen schilderwerken.</p> <p>De renovatie van de turnzaal omvat het vervangen van het buitenschrijnwerk (dubbel glas), binnenschrijnwerk en lichtstraat, nieuwe afwerking op alle wanden, binnenschilderwerken, vervangen van de bestaande sportvloer en vaste sportinfrastructuur, en het plaatsen van akoestische panelen. Het vernieuwen van de technische installaties bevat in hoofdzaak het plaatsen van stralingspanelen (verwarming), nieuwe verlichting en een nieuwe verluchttingsinstallatie.</p>
Oppervlakte:	
Klasse/categorie	D6
Timing (studie, aanvang werken)	Aanbesteding: 14/09/22 – gunning: 16/11/22 Start der werken: 06/02/2023
Voorziene uitvoeringstermijn	220 werkdagen (theorievleugel) – 120 werkdagen (turnzaal)
Werkelijke uitvoeringstermijn	In uitvoering
Datum voorlopige oplevering	in uitvoering
Definitieve oplevering	In uitvoering
Gunningsbedrag	€ 2 638 439,60
Totale kostprijs bij eindafrekening	In uitvoering
Bijlage:	

Plan- en beeldmateriaal:

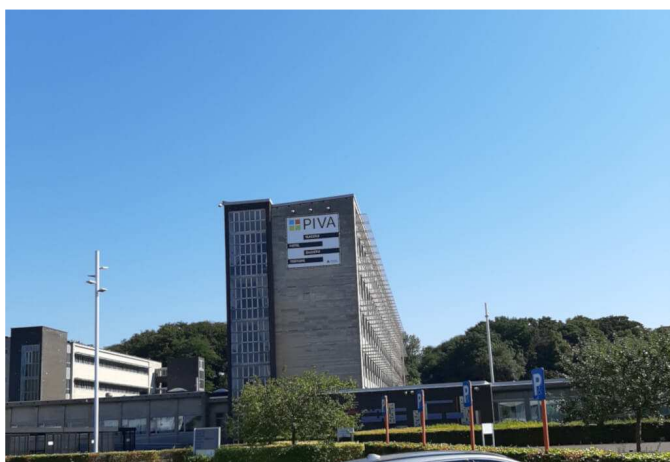

PIVA ANTWERPEN

